


**ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día 31 de Agosto del año dos mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas general de la Fiscalía General del Estado, sita en Circuito Guizar y Valencia número setecientos siete, colonia Reserva Territorial de esta ciudad capital, los CC. L.C.P Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado y Presidenta del Comité; Ing. José Francisco Robles Tejeda, Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública y Secretario Técnico del Comité de Obra Pública de la Fiscalía General del Estado; Lic. José Montiel Dávila en representación de la L.C.P. Rosario Palacios Carlín, Subdirectora de Recursos Financieros; Lic. Said Tannos Salas, Coordinador de Subsidios Federales; C.P. Juan Manuel Carrillo Hernández, en representación de la C.P. María Estela Mortera Liñán, Subdirectora de Recursos Humanos; Arq. Ricardo Gómez González, Jefe del Departamento de Obra Pública; todos ellos servidores públicos en la Fiscalía General del Estado; Así como la Lic. María del Pilar Beltrán Cisneros, Contralora General de la Fiscalía General del Estado y el Ing. Héctor Efrén López Hidalgo Subdirector de control y evaluación de la Contralora General de la Fiscalía General del Estado; Por parte de la iniciativa privada el Lic. Octavio Jiménez Silva consejero de COPARMEX en representación del L.A.E. Luis Sánchez Ávila presidente del consejo patronal de la República Mexicana (COPARMEX Xalapa) Con la finalidad de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., Ejercicio 2017.-

Orden del Día

1. *Bienvenida.*
2. *Lista de Asistencia.*
3. *Aprobación del Orden del día.*
4. *Informar del Proceso Licitatorio de la Obra denominada "Impermeabilización de las azoteas de la fiscalía General y de la Dirección General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la Ciudad de Xalapa".*
5. *Informar del avance de la Obra: Tercera Etapa de la Construcción del Edificio B de la Unidad Antisecuestro del Estado de Veracruz.*
6. *Informar del avance de la Obra: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Coatzacoalcos.*
7. *Informar del avance de la Obra: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Orizaba.*
8. *Informar del avance de la Obra: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan.*
9. *Informar del avance de la Obra: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Norte.*
10. *Informar del avance de la Obra: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Centro.*
11. *Informar del avance de la Obra: Proyecto Ejecutivo y Adecuación de un Centro Integral de Justicia en Poza Rica.*

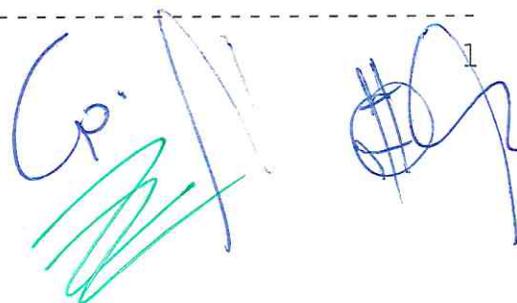



ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

12. *Asuntos Generales.* -----

13. *Clausura y convocatoria a la siguiente Reunión.* -----

Desahogo del orden del día

1. *Bienvenida.* -----

Siendo las 10:35 horas y comenzando con el punto uno del orden el día, se procede a dar inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En uso de la palabra la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia a esta Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejercicio 2017. -----

Lista de Asistencia. -----

Siguiendo con el punto dos del orden del día, la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón Oficial Mayor y Presidenta del Comité, solicita al Ing. José Francisco Robles Tejeda, Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública y Secretario Técnico del Comité, su apoyo en el deshago de esta sesión, una vez aceptado el encargo el C. Ing. José Francisco Robles Tejeda en uso de la palabra, procede a pasar lista de asistencia, haciéndose constar que existe quórum legal para dar inicio formal a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejercicio 2017. -----

Así mismo, se realiza la observación de que se encuentra presente un representante de la iniciativa privada, por lo que se solicita se declare la existencia de quórum legal para la realización programada. Haciéndose constar entonces, que existe quórum legal para dar inicio formal a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejercicio 2017. -----

2. Aprobación del Orden del Día. -----

Acto seguido, continuando con el punto tres, el C. Ing. José Francisco Robles Tejeda, Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública y Secretario Técnico del Comité, manifiesta a los convocados que una vez que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión, se procede a realizar la lectura del orden del día, sometiéndolo a consideración de los presentes, para su aprobación. -----

Los miembros presentes aprueban por mayoría relativa de votos el orden del día, tomando el siguiente **ACUERDO ORD/04/17-037.** -----

Agotados los puntos 1, 2 y 3 se pasa al siguiente punto del Orden del Día. -----

3. Informar del Proceso Licitatorio de la Obra denominada "Impermeabilización de las azoteas de la fiscalía General y de la Dirección General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la Ciudad de Xalapa". -----

Acto seguido, continuando con el punto cuatro, la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, solicita al Ing. José Francisco Robles Tejeda, Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública y Secretario Técnico del Comité, su apoyo en el deshago de este punto, a su vez el Ing. José Francisco Robles Tejeda, cede la palabra al C. Arq. Ricardo Gómez González, Jefe del

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink on the right side of the page]



ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Departamento de Obra Pública y vocal de este comité, quien expone al pleno del comité el informe del Proceso Licitatorio mediante a invitación a cuando menos tres personas de la Obra denominada "Impermeabilización de las azoteas de la fiscalía General y de la Dirección General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la Ciudad de Xalapa. -----

PRIMERO. - Que la invitación a los contratistas: "Adolfo Zúñiga Ortiz", "Construcciones Ruimen Veracruz, S.A. de C.V." y Proyectos y Construcciones Tarjus S.A. de C.V." se les entregó el día 13 de julio del presente año. -----

SEGUNDO. - Que las contratistas mencionadas en el primer punto, aceptan nuestra invitación con fecha 14 de julio de 2017. -----

TERCERO. - Con fecha 17 de julio de 2017, se realizó por parte de las contratistas "Adolfo Zúñiga Ortiz", "Construcciones Ruimen Veracruz, S.A. de C.V." y "Proyectos y Construcciones Tarjus S.A. de C.V.", la visita al sitio donde se ejecutarán los servicios. -----

CUARTO. - La junta de aclaraciones de la visita a los sitios de la obra se realizó el día 19 de julio de 2017. -----

QUINTO. - El día 24 de julio se llevó a cabo la apertura de la propuesta técnica-económica presentada por parte de las contratistas "Adolfo Zúñiga Ortiz", "Construcciones Ruimen Veracruz, S.A. de C.V." y Proyectos y Construcciones Tarjus S.A. de C.V.", resultando ganador el contratista "Adolfo Zúñiga Ortiz", de acuerdo a la siguiente tabla: -----

CONTRATISTA	MONTO S/IVA	Ppto Base S/IVA	Dif. Ppto Base Vs propuestas
Adolfo Zúñiga Ortiz	\$1,712,021.90	\$1,713,590.52	-0.09%
Construcciones Ruimen Veracruz, S.A. de C.V.	\$1,723,545.03	\$1,713,590.52	0.58%
Proyectos y Construcciones Tarjus S.A. de C.V.	\$1,920,468.65	\$1,713,590.52	10.77%

SEXTO. - Con fecha 28 de julio de 2017 se informó al contratista "Adolfo Zúñiga Ortiz" el dictamen y fallo por el que se le adjudica la realización de los trabajos de "Impermeabilización de las azoteas de la fiscalía General y de la Dirección General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la Ciudad de Xalapa." -----

SÉPTIMO. - Que el 15 de agosto se firmó el contrato del servicio "Impermeabilización de las azoteas de la fiscalía General y de la Dirección General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la Ciudad de Xalapa." entre la FGE y el contratista "Adolfo Zúñiga Ortiz". -----

OCTAVO. - Los servicios tienen un periodo de ejecución de 70 días naturales, iniciando el 21 de agosto de 2017 y terminando el 29 de octubre de 2017. -----

NOVENO. - Que el día 30 de agosto se realiza la transferencia bancaria del anticipo por un monto de \$595,783.62 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.) incluido el IVA. -----



ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

DECIMO. - Que los trabajos iniciarán el lunes 4 de septiembre del presente año. -----
Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente: -----

ACUERDO ORD/04/17-038, Los representantes del Comité se dan por enterados del informe del Proceso Licitatorio de la Obra denominada "Impermeabilización de las azoteas de la fiscalía General y de la Dirección General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la Ciudad de Xalapa -----

4. Informar del avance de la Obra: Tercera Etapa de la Construcción del Edificio B de la Unidad Antisecuestro del Estado de Veracruz. -----

Acto seguido, continuando con el punto cinco, la C. L.C.P. Gabriela Mercedes Reva Hayón, Oficial Mayor y Presidenta del Comité, solicita al Ing. José Francisco Robles Tejeda, Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública y Secretario Técnico del Comité, su apoyo en el deshago de este punto, a su vez el Ing. José Francisco Robles Tejeda, cede la palabra al C. Arq. Ricardo Gómez González, Jefe del Departamento de Obra Pública, quien expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. -----

Avance físico del 100% de los trabajos contratados, correspondientes al contrato No. OP 01/2017-DGA, por un monto de \$9, 430,261.36 (nueve millones cuatrocientos treinta mil doscientos sesenta y un pesos 36/100 M.N), al día de hoy se han realizado los siguientes trabajos: Limpieza manual y con maquinaria de las estructuras de acero; aplicación de primario (pintura anticorrosiva) y pintura de esmalte blanca; habilitado de estructura para mezzanine planta baja; habilitación y colocación de acero estructural de azotea donde se utilizará para bodega y cafetería. Así como inicio de los trabajos referentes al convenio único de ampliación en monto el cual tiene un avance del 4% de total de 34% que incluye trazo, nivelación y excavación de la barda perimetral-----

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente:-----

ACUERDO ORD/04/17-039, Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance de Obra de la Tercera Etapa de la Construcción del Edificio B de la Unidad Antisecuestro del Estado de Veracruz. -----

5. Informar del avance de la Obra: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Coatzacoalcos. -----

Continuando con el uso de la palabra el C. Arq. Ricardo Gómez González, jefe del departamento de obra pública, expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. -----

Avance físico del 35%, al momento se han realizado los siguientes trabajos: Trazo y nivelación del predio, Destinación de áreas para trabajos, lugares de carga y descarga, Propuesta de conexión de transición eléctrica, Acarreos para el relleno del lado norte, Habilitado de acero para zapatas en muro de contención, Enriquecimiento de tierra para primera capa de 30 cm en lado norte, Asignación y uso de banco de material en su extremo más alejado al muro del CE.RE.SO. Pruebas de suelo para capas posteriores-----

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente:-----

ACUERDO ORD/04/17-040, Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance de Obra del Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Coatzacoalcos. -----

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]



ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

6. Informar del avance de la Obra: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Orizaba.

Continuando con el uso de la palabra el C. Arq. Ricardo Gómez González, jefe del departamento de obra pública, expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención.

Avance físico del 20%, al momento se han realizado los siguientes trabajos: Trazo y nivelación del terreno para establecer ejes, Excavaciones para desplantar cimientos, armado de la cimentación y colado el 60 % de dados, trabes y contratrabes.

ACUERDO ORD/04/17-041 Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance de Obra del Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Orizaba.

7. Informar del avance de la Obra: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan.

Continuando con el uso de la palabra el C. Arq. Ricardo Gómez González jefe del departamento de obra pública, expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. Avance físico del 10%, al momento se han realizado los siguientes trabajos: trazos y nivelación para adecuar el área del edificio, excavación a 50 cm para material de filtro por exceso de humedad del material y ocasionando rebote del material de relleno nuevo, compactación de 4 capas de 20 cm para llegar al nivel deseado, donde se desplanta cimentación del edificio e inicio de trabajos con acero de refuerzo y dados para la etapa de cimentación

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente:

ACUERDO ORD/04/17-042, Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance de Obra del Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan-

8. Informar del avance de la Obra: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Norte.

Continuando con el uso de la palabra el C. Arq. Ricardo Gómez González, jefe del departamento de obra pública, expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. Avance físico del 45%, al momento se han realizado los siguientes trabajos: Trazo y nivelación, Relleno con nivelación de un metro de nivel de banquetta la plancha de desplante del edificio, Excavación para trabes de liga y dados, Plantilla en trabes y dados, Armado de cimentación, Colado de contratrabes y dados, incluyendo las placas, estructura completa, toda la colación de losa acero, 50 % de muros en planta baja.

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente:

ACUERDO ORD/04/17-043, Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance de Obra del Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Norte.

9. Informar del avance de la Obra: Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Centro.

Continuando con el uso de la palabra el C. Arq. Ricardo Gómez González jefe del departamento de obra pública, expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. Anticipo a la fecha no se ha entregado, Avance físico del 0%, Problema

(Handwritten signatures and initials in blue and green ink)



ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

de índole social, en trámite de resolución -----

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente: -----

ACUERDO ORD/04/17-044, Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance de Obra del Proyecto Ejecutivo y Construcción de un Centro Integral de Justicia en Veracruz Centro-----

10. Informar del avance de la Obra: Proyecto Ejecutivo y Adecuación de un Centro Integral de Justicia en Poza Rica. -----

Continuando con el uso de la palabra el C. Arq. Ricardo Gómez González jefe del departamento de obra pública, expone al pleno del comité los avances físicos de la obra en mención. Avance físico del 38%, al momento se han realizado los siguientes trabajos: Levantamiento de muros a base de block, castillos, cadena de cerramiento, cimbra para loza azotea, armado de acero de 3/8", 1/2" y 5/8" en loza de azotea. -----

Sin ningún comentario, el Pleno del Comité toma el siguiente:-----

ACUERDO ORD/04/17-045, Los representantes del Comité se dan por enterados del Avance de Obra del Proyecto Ejecutivo y Adecuación de un Centro Integral de Justicia en Poza Rica. -----

11. Asuntos Generales. -----

Por lo que hace al onceavo punto, en Asuntos Generales, en uso de la palabra la Lic. María del Pilar Beltrán Cisneros Contralora General De la FGE, expresa su agradecimiento a la labor que se está desempeñando de manera coordinada, entre el departamento de obras públicas y el área que ella atinadamente dirige; al mismo tiempo manifiesta que la información soporte se envíe con anticipación para su análisis. -----

En uso de la palabra el Lic. Octavio Jiménez Silva Consejero de COPARMEX Xalapa, recomienda para la ejecución de las obras posteriores verificar la situación del predio con la finalidad de eficientar el proceso y evitar afectaciones tanto al constructor como a la sociedad. -----

12. Clausura y convocatoria a la siguiente Reunión. -----

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:30 horas, agradecemos la presencia de todos los aquí reunidos, recordándoles que la próxima Sesión Ordinaria está programada para el día viernes 27 de Octubre de 2017. -----

Para finalizar la reunión, El Ing. José Francisco Robles Tejeda, Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública y Secretario Técnico del Comité de Obra Pública de la Fiscalía General del Estado, solicita que en caso de que alguno de los presentes tenga alguna duda o asunto que tratar, se sirva a expresarlo. -----

Sin otro tema que exponer por parte de los integrantes del Comité de Obras Públicas en éste punto, se da por concluida la presente sesión, agradeciendo a los presentes su asistencia. -----

POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

L.C.P. Gabriela M. Reva Hayón
Oficial Mayor y Presidenta del Comité
de la Fiscalía General del Estado




**ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**


Ing. José Francisco Robles Tejeda ✕
Subdirector de Recursos Materiales y Obra Pública
y Secretario Ejecutivo del Comité


Lic. José Montiel Dávila ✕
En representación de la subdirectora de Recursos Financieros


Lic. Said Tannos Salas ✕
Coordinador de Subsidios Federales


C.P. Juan Manuel Carrillo Hernández ✕
Representante de la Subdirectora de Recursos Humanos


Arq. Ricardo Gómez González ✕
Representante del Jefe del Departamento
de Obra Pública

**ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**



Lic. María del Pilar Beltrán Cisneros
Contralora General
De la FGE.



Ing. Héctor Efrén López Hidalgo
Subdirector de control y evaluación de la Contralora General de la FGE.

POR EL SECTOR PÚBLICO



Lic. Octavio Jiménez Silva
Consejero de COPARMEX Xalapa
